

باسمه تعالی

تکلیف تحویلی درس کنترل پروژه

زمان تحویل: شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

نام استاد: جناب آقای دکتر رفیعی

دانشجو: سینا طاهری ۹۴۱۰۴۱۰۱

پروژه: برگزاری تریبون آزاد دانشجویی

۲ روش WBS برای آن

*نکته: این تکلیف حاصل تجربه بنده در برگزاری برنامه تریبون آزاد در فضای باز در سطح دانشگاه و درباره موضوعی حساس و سیاسی است که در روز سه شنبه، ۲۶ بهمن ماه، ساعت ۱۲:۴۵، در ضلع جنوبی ساختمان ابن سینا برگزار شد.



تریبون آزاد شریف

به همت جامعه اسلامی شریف

انقلاب \Leftrightarrow آزادی ?

۳۸ سال گذشت، آیا پیشرفت داشته ایم؟

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ساعت

۱۲:۴۵، ضلع جنوبی ساختمان ابن سینا

گام اول در طراحی WBS پروژه‌ها عبارتست از:

*شناسایی اهداف پروژه: با توجه به اینکه جامعه اسلامی شریف قصد داشت که برنامه تریبون آزاد ادامه یابد و این برنامه، اولین و آخرین برنامه تریبون آزاد در سطح دانشگاه نباشد و با توجه به حساسیت موضوع برنامه، هدف جامعه اسلامی در این پروژه این بود که برنامه به نحوی برگزار شود که، بتوان برای برنامه‌های بعدی مجوز گرفت و اعتماد دانشگاه به فعالین دانشجویی در برپایی این گونه برنامه‌ها از بین نرود.

***شناسایی آرمان پروژه:** شکل‌گیری فضای دیالوگ و تضارب آرا – افراد در پشت تریبون بتوانند بدون واگمه و ترس، نظرات خود را درباره موضوع برنامه بیان کنند – فضایی شکل بگیرد که دانشجویان خود را در تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی، سهیم بدانند.

***شناسایی محدودیت‌های پروژه:** ممکن است سخنرانی‌های خلاف قوانین موضوعه کشور ایراد شود – ممکن است فضای سخنرانی‌ها تهییج شود و حرکت‌هایی انجام شود که خلاف شئون فرهنگی باشد – ممکن است سخنرانی‌های پشت تریبون، به موضوع تریبون بی‌ربط باشد – ممکن است، دانشجویی در تریبون به مسئولین دانشگاه توهین کند و ...

***شناسایی فرضیات پروژه:** با توجه به اینکه برنامه در فضای باز برگزار می‌شود، وضعیت آب و هوا و اینکه آیا هوا در آن زمان آفتابی است یا ابری یا بارانی، مهم است – ممکن است حراست دانشگاه وارد عمل شود و برای برنامه مشکلاتی ایجاد کند.

باید برای هر دو موضوع بالا تدبیری اندیشیده شود. در صورت بارانی بودن هوا می‌توان به زیر ساختمان ابن‌سینا پناه برد و برنامه را در آنجا برگزار کرد.

باید عده‌ای از دانشجویان هم به عنوان حراست در برنامه حضور داشته باشند که برنامه دارای خودکنترلی باشد.

اولین روش (WBS (Work Breakdown Structure

*ساختار تجزیه چرخه عمر Life Cycle Breakdown Structure

یک سلسله از مراتب تقسیم پروژه به مراحل چرخه عمر

در این مدل تجزیه، پروژه را به مراحل کوچکتر عمر آن تقسیم می‌کنیم.

مرحله اول: ایده

مرحله دوم: طراحی و توسعه


مرحله سوم: اجرا که خود آن به سه مرحله‌ی قبل برنامه، حین برگزاری برنامه و بعد برنامه تقسیم می‌شود.

دومین روش ساختار تجزیه کار

این روش تجزیه با توجه به یکی از دغدغه‌های ما در برگزاری این برنامه طراحی شده است. این دغدغه عبارت است از اینکه تیم برگزاری این برنامه می‌خواهند برد رسانه‌ای برنامه زیاد باشد و میزان مشارکت افراد و دانشجویان و صحبت آن‌ها پشت تریبون به حداکثر برسد.

Life Cycle Breakdown Structure

برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در فضای باز

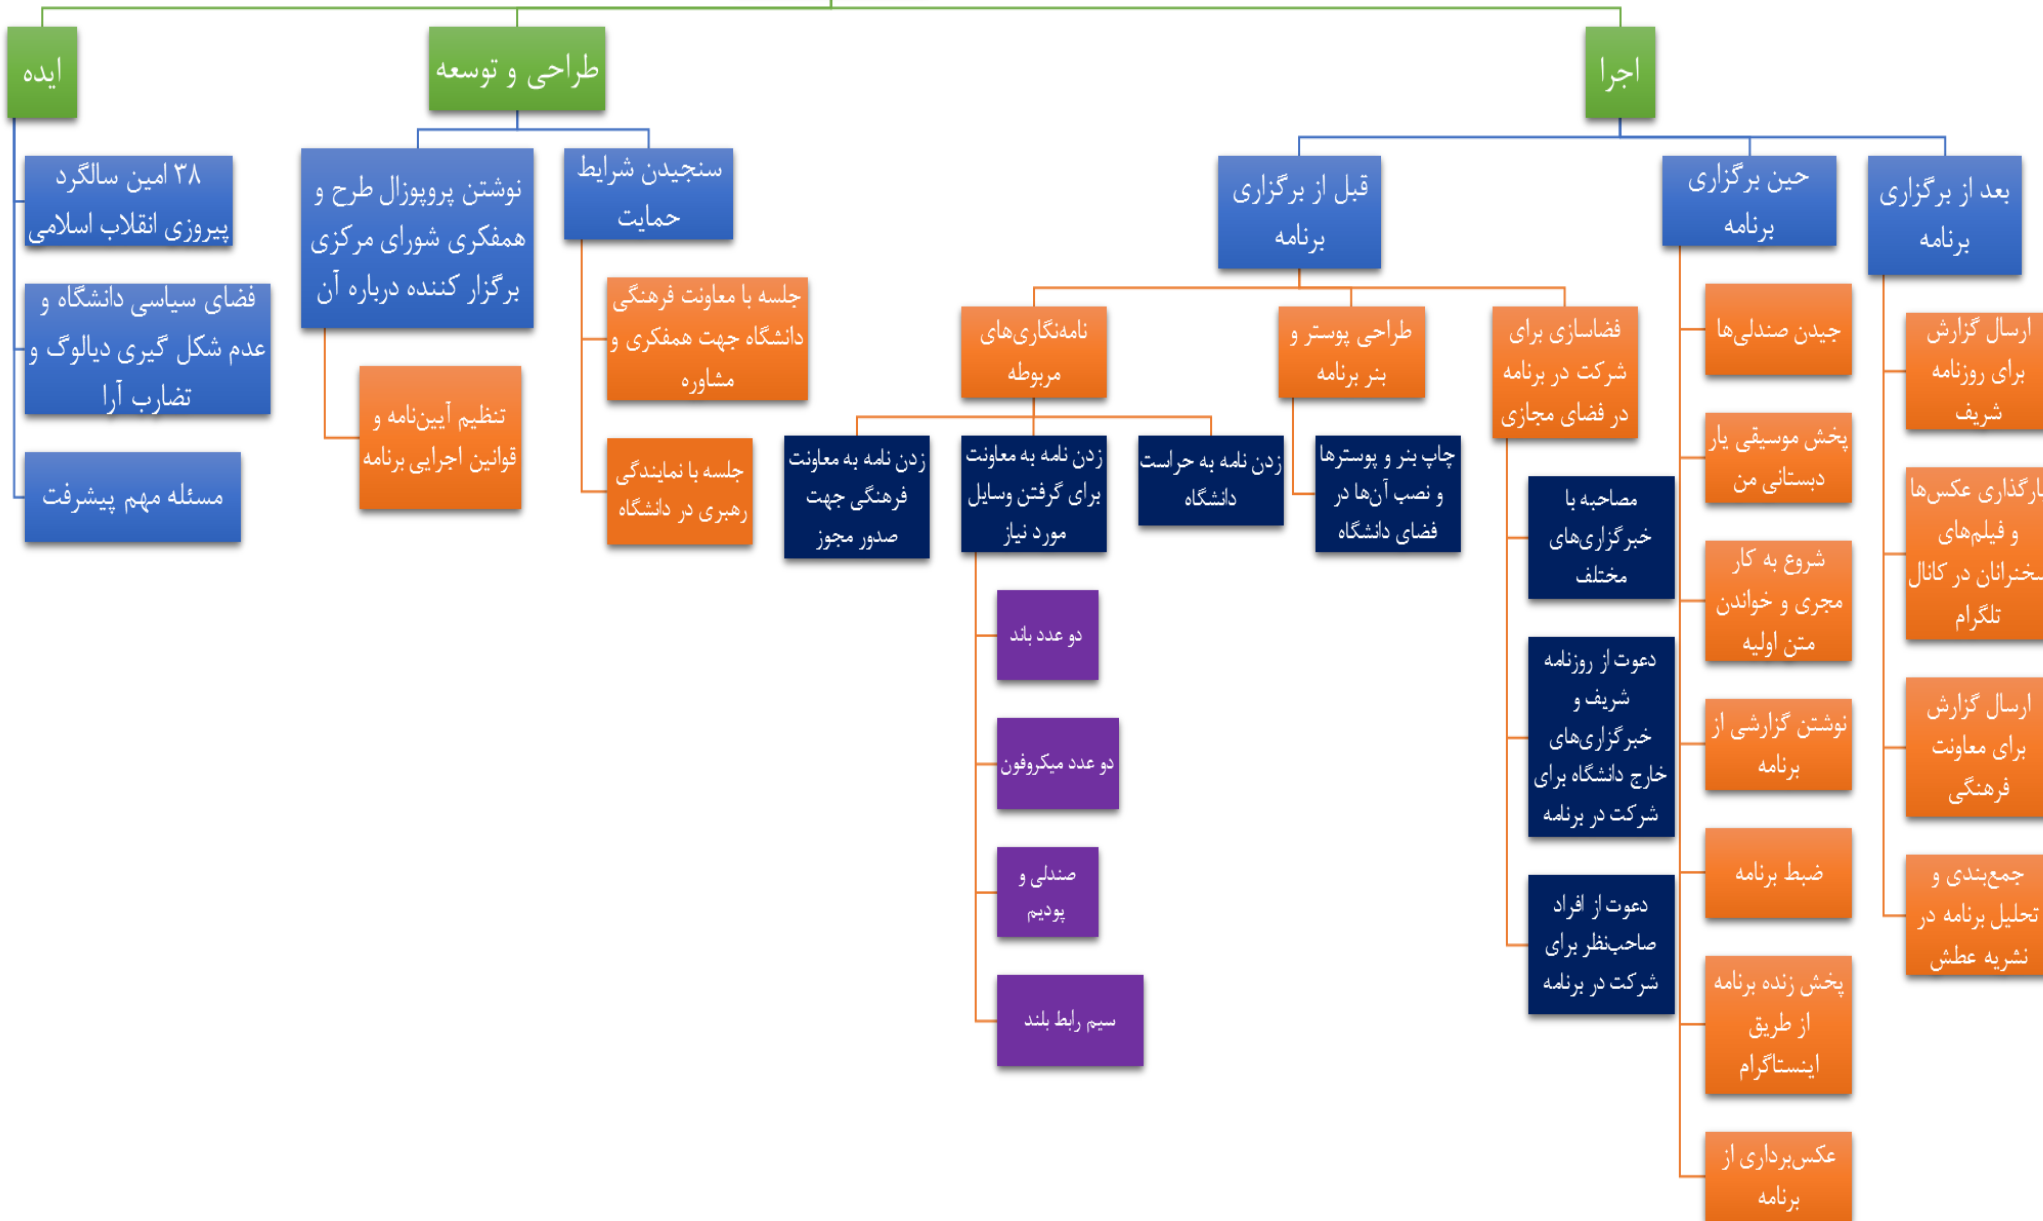

تجزیه ساختار بر اساس فعالیت رسانه‌ای

برگزاری تریبون آزاد
دانشجویی در فضای
باز

فعالیت‌های
رسانه‌ای

فعالیت‌های
غیر رسانه‌ای

تلگرام

ایجاد کانال برای
اطلاع‌رسانی
برنامه‌ها

بارگذاری فیلم
سخنرانی‌ها در
کانال

دادن پوستر به
کانال‌های مختلف
برای تبلیغ آن

بارگذاری پوستر

اجازه گرفتن از
سخنرانان

اینستاگرام

پخش زنده برنامه
از طریق
اینستاگرام

روزنامه
شریف

تهیه گزارشی از
برنامه برای
روزنامه

خبرگزاری‌های
خارج دانشگاه

مصاحبه با
خبرگزاری‌ها

دعوت از آن‌ها
برای پوشش
برنامه

درخواست‌های
مجوز

درخواست مجوز از
معاونت فرهنگی

درخواست برای
باند و میکروفون و
پودیم

هماهنگی با
حراست دانشگاه

نوشتن پروپوزال طرح و
همفکری شورای مرکزی
درباره آن

تنظیم آیین‌نامه و
قوانین اجرایی برنامه

سنجیدن شرایط
حمایت

جلسه با معاونت فرهنگی
دانشگاه جهت همفکری و
مشاوره

جلسه با نمایندگی
رهبری در دانشگاه
